

FAISM 2023

ESTIMACIONES



2023/FAISM083002

RECIBO DE ESTIMACIÓN

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA

CONTRATISTA				CONTRATO	
ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES				NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO
DOMICILIO: CALLE CRISTOBAL COLON, #8, COL. EMILIANO ZAPATA				PMZ-FAISM-083/2023-002	04 DE DICIEMBRE DE 2023
CIUDAD:	SAN FELIPE OROZITLAN	ESTADO:	HGO, MEXICO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
R.F.C.:	HERC880707NY4	TELÉFONO	7711390723	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)				TERMINACIÓN DE OBRA:	05 DE ENERO DE 2024
MONTO CONTRATADO:	\$450,000.00			ANTICIPO:	\$0.00

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

\$444,181.03 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)

ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)	
ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$387,931.03
I.V.A.	\$62,068.97
TOTAL DE ESTIMACIÓN:	\$450,000.00
DEDUCCIONES	
ANTICIPO 30%	\$0.00
0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,939.66
1 % OBS	\$3,879.31
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$5,818.97
BUENO POR:	\$444,181.03

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES

PERSONA FISICA

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





DEPENDENCIA:	RESUMEN DE ESTIMACIONES	HOJA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO PMZ-FAISM-083/2023-002	FECHA DE INICIO CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
UBIACIÓN: MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MONTO CONTRATADO: \$450,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 05 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA: ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	MONTO DE ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION
R.F.C.: HERC880707NY4	\$0.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024

RESUMEN ESTIMACIONES										
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN I.V.A.	I.V.A DE ESTIMACIÓN	TOTAL ESTIMADO	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	1 % OBS	0.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.20 % CAPACITACIÓN	TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGO LIQUIDO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)		\$387,931.03	\$62,068.97	\$450,000.00	\$0.00	\$3,879.31	\$1,939.66	\$0.00	\$5,818.97	\$444,181.03
TOTALES		\$387,931.03	\$62,068.97	\$450,000.00	\$0.00	\$3,879.31	\$1,939.66	\$0.00	\$5,818.97	\$444,181.03

IMPORTES CON I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$450,000.00
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$450,000.00
DESCUENTOS:	\$5,818.97
TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$444,181.03
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$450,000.00
SALDO POR PAGAR:	\$0.00


ANTICIPOS	
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN		
ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$387,931.03
I.V.A.	16.00%	\$62,068.97
TOTAL DE ESTIMACIÓN:		\$450,000.00
DEDUCCIONES		
1 AL MILLAR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA		\$3,879.31
ANTICIPO 30%		\$0.00
0.5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		\$1,939.66
TOTAL DE DESCUENTOS:		-\$5,818.97
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN		\$444,181.03

 ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE HERROS CONSTRUCTORA	 ING. JESSICA YAE LZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	 ING. GUSTAVO ANGEL RAMOS DE ANGEL LOPEZ DIRECTOR MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--



MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		EMPRESA	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002		06 DE DICIEMBRE DE 2023			
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023		INICIO DE OBRA:		05 DE ENERO DE 2024			
MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00		TERMINACIÓN:		PERIODO DE EJECUCION			
UBICACIÓN: LINDAVISTA		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024					

RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR CAPITULO

CLAVE	HOJA	DE ESTA ESTIMACIÓN
PRELIMINARES	1	\$16,280.12
ALBAÑILERIA	1	\$340,679.95
ACABADOS	1	\$25,832.92
MAMPARA INFORMATIVA	1	\$5,138.04
	SUBTOTAL	\$387,931.03
	IVA	\$62,068.97
	TOTAL	\$450,000.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	---	---

2020 - 2024



MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA

CONTRATO

ESTIMACION I (FINIQUITO)

CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN DIVERSAS
CALLES, LINDAVISTA

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2023-002
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$450,000.00

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION
06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PRELIMINARES							
EF23c0034	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.29816	3.75	0	3.75	\$ 149.50	\$ 560.63
AX23c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	11.49080	15.00	0	15.00	\$ 14.15	\$ 212.25
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	473.89000	452.85	0	452.85	\$ 4.13	\$ 1,870.27
AA23c0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	151.62000	144.92	0	144.92	\$ 66.88	\$ 9,692.25
AX23c0031	ALBAÑILERIA	M3	151.62000	144.92	0	144.92	\$ 27.22	\$ 3,944.72
EF23c0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN; ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M	412.11000	440.91	0	440.91	\$ 368.45	\$ 162,453.29
3-6083-0001-C1	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	131.84000	123.74	0	123.74	\$ 44.00	\$ 5,444.56
AX23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	131.84000	123.74	0	123.74	\$ 29.65	\$ 3,668.89
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,832.57000	1,719.99	0	1,719.99	\$ 15.11	\$ 25,969.05



[Handwritten signature]

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA

ESTIMACION I (FINIQUITO)

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-063/2023-002
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$450,000.00
 INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION
 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE
 GUARNICIONES Y
 BANQUETAS EN DIVERSAS
 CALLES, LINDAVISTA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EF23c0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	131.84000	123.74	0	123.74	\$ 88.00	\$ 10,889.12
EF23c0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE	M2	412.11000	386.72	0	386.72	\$ 341.94	\$ 132,235.04
ACABADOS								
EF23c0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	412.11000	440.91	0	440.91	\$ 58.59	\$ 25,832.92
MAMPARA INFORMATIVA								
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0	1.00	\$ 5,138.04	\$ 5,138.04
TOTAL							\$	387,931.03
I.V.A							\$	62,068.97
GRAN TOTAL							\$	450,000.00



ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES
 SUPERVISOR DE OBRA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO				ESTIMACION 1 (FINIQUITO)				EMPRESA					
CONTRATO		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002				06 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTIMACION 1 (FINIQUITO)					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA		FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023				05 DE ENERO DE 2024				ESTIMACION 1 (FINIQUITO)					
MONTA CONTRATADO: \$450,000.00		UBICACIÓN: LINDAVISTA				PERIODO DE EJECUCION: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024				ESTIMACION 1 (FINIQUITO)					
CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	DESAR	ELEM	PZA	KG	SUBTOTAL	TOTAL	P.U.	IMPORTE

EF23c0034	PRELIMINARES DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE. ACARREO DEL MATERIAL A 1b. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3													
			BANQ	1	24.98	1	0.08								
			GUAR	1	24.98	0.15	0.4		0.2			1.75			
												2.00			
AX23c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM													
			IDEM.	1	EF23c0034	3.75	4					15			
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2													
				1	24.98	1.15	1.15					28.73			
				2	29.72	1.15	1.15					34.18			
				3	60.87	1.15	1.15					70			
				3	-2	1.15	1.15					-2.3			
				3	25.98	1.15	1.15					29.88			
				3	-2.6	1.15	1.15					-2.99			
				4	97.36	1.15	1.15					111.96			
				5	51.76	1.15	1.15					59.52			
				5	3.23	0.8	0.8					2.58			
				6	96.31	0.8	0.8					77.05			
				6	16.69	0.8	0.8					13.35			
				7	5.11	0.8	0.8					4.09			
				8	33.5	0.8	0.8					26.8			
AA23c0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3													
				1	24.98	1.15	0.32					9.19			
				2	29.72	1.15	0.32					10.94			
				3	60.87	1.15	0.32					22.4			
				3	-2	1.15	0.32					-0.74			
				3	25.98	1.15	0.32					9.56			
				3	-2.6	1.15	0.32					-0.96			
				4	97.36	1.15	0.32					35.63			
				5	51.76	1.15	0.32					19.05			
				5	3.23	0.8	0.32					0.83			
				6	96.31	0.8	0.32					24.66			
				6	16.69	0.8	0.32					4.27			
				7	5.11	0.8	0.32					1.31			
				8	33.5	0.8	0.32					8.58			
													144.92	\$66.88	9,692.25



ING. GUSTAVO ANTONIO DE ANGELO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEEMPOALA

ING. JESSICA YAREL ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO										ESTIMACION I (FINIQUITO)		EMPRESA					
CONTRATO		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002										ESTIMACION I (FINIQUITO)		ESTIMACION I (FINIQUITO)					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA		FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023		INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023		TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024		PERIODO DE EJECUCION		SUBTOTAL		TOTAL		P.U.		IMPORTE			
MUNTO CONTRATADO: \$450,000.00		UBICACIÓN: LINDAVISTA		TRAMO: 8		LARGO: 33.5		ANCHO: 0.65		ALTO: 0.32		DESAR		ELEM		PZA		KG	
CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	DESAR	ELEM	PZA	KG	SUBTOTAL	TOTAL	P.U.	IMPORTE				
AX23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	CALLE JUAN SALVADOR	8	33.5	0.65	0.32					6.97	123.74	\$29.65	\$ 3,668.89				
			CALLE JUAN ESCUTIA	1	24.98	1	0.32					7.99							
			CALLE JUAN ESCUTIA	2	29.72	1	0.32					9.51							
			CALLE JUAN ESCUTIA	3	60.87	1	0.32					19.48							
			Escalon existente	-2	-2	1	0.32					-0.64							
			CALLE JUAN ESCUTIA	3'	25.98	1	0.32					8.31							
			Acceso existente	3'	-2.6	1	0.32					-0.83							
			CALLE JUAN ESCUTIA	4	97.36	1	0.32					31.16							
			CALLE JUAN ESCUTIA	5	51.76	1	0.32					16.56							
			CALLE JUAN ESCUTIA	5'	3.23	0.65	0.32					0.67							
			CALLE JUAN SALVADOR	6'	96.31	0.65	0.32					20.03							
			CALLE JUAN SALVADOR	6'	16.69	0.65	0.32					3.47							
			CALLE JUAN SALVADOR	7	5.11	0.65	0.32					1.06							
			CALLE JUAN SALVADOR	8	33.5	0.65	0.32					6.97							
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM											1719.99	\$15.11	\$ 25,989.05				
					123.74	13.9													
EF23c0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3											123.74	\$88.00	\$ 10,889.12				
			CALLE JUAN ESCUTIA	1	24.98	1	0.32					7.99							
			CALLE JUAN ESCUTIA	2	29.72	1	0.32					9.51							
			CALLE JUAN ESCUTIA	3	60.87	1	0.32					19.48							
			Escalon existente	-2	-2	1	0.32					-0.64							
			CALLE JUAN ESCUTIA	3'	25.98	1	0.32					8.31							
			Acceso existente	3'	-2.6	1	0.32					-0.83							
			CALLE JUAN ESCUTIA	4	97.36	1	0.32					31.16							
			CALLE JUAN ESCUTIA	5	51.76	1	0.32					16.56							
			CALLE JUAN ESCUTIA	5'	3.23	0.65	0.32					0.67							
			CALLE JUAN SALVADOR	6'	96.31	0.65	0.32					20.03							
			CALLE JUAN SALVADOR	6'	16.69	0.65	0.32					3.47							
			CALLE JUAN SALVADOR	7	5.11	0.65	0.32					1.06							
			CALLE JUAN SALVADOR	8	33.5	0.65	0.32					6.97							
EF23c0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2											386.72		132,235.04				
					24.98	1						24.98							
					29.72	1						29.72							



ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA

2020-2024

ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA



CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:


ESTIMACION

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002
 INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00
 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA

CROQUIS DE LOCALIZACION

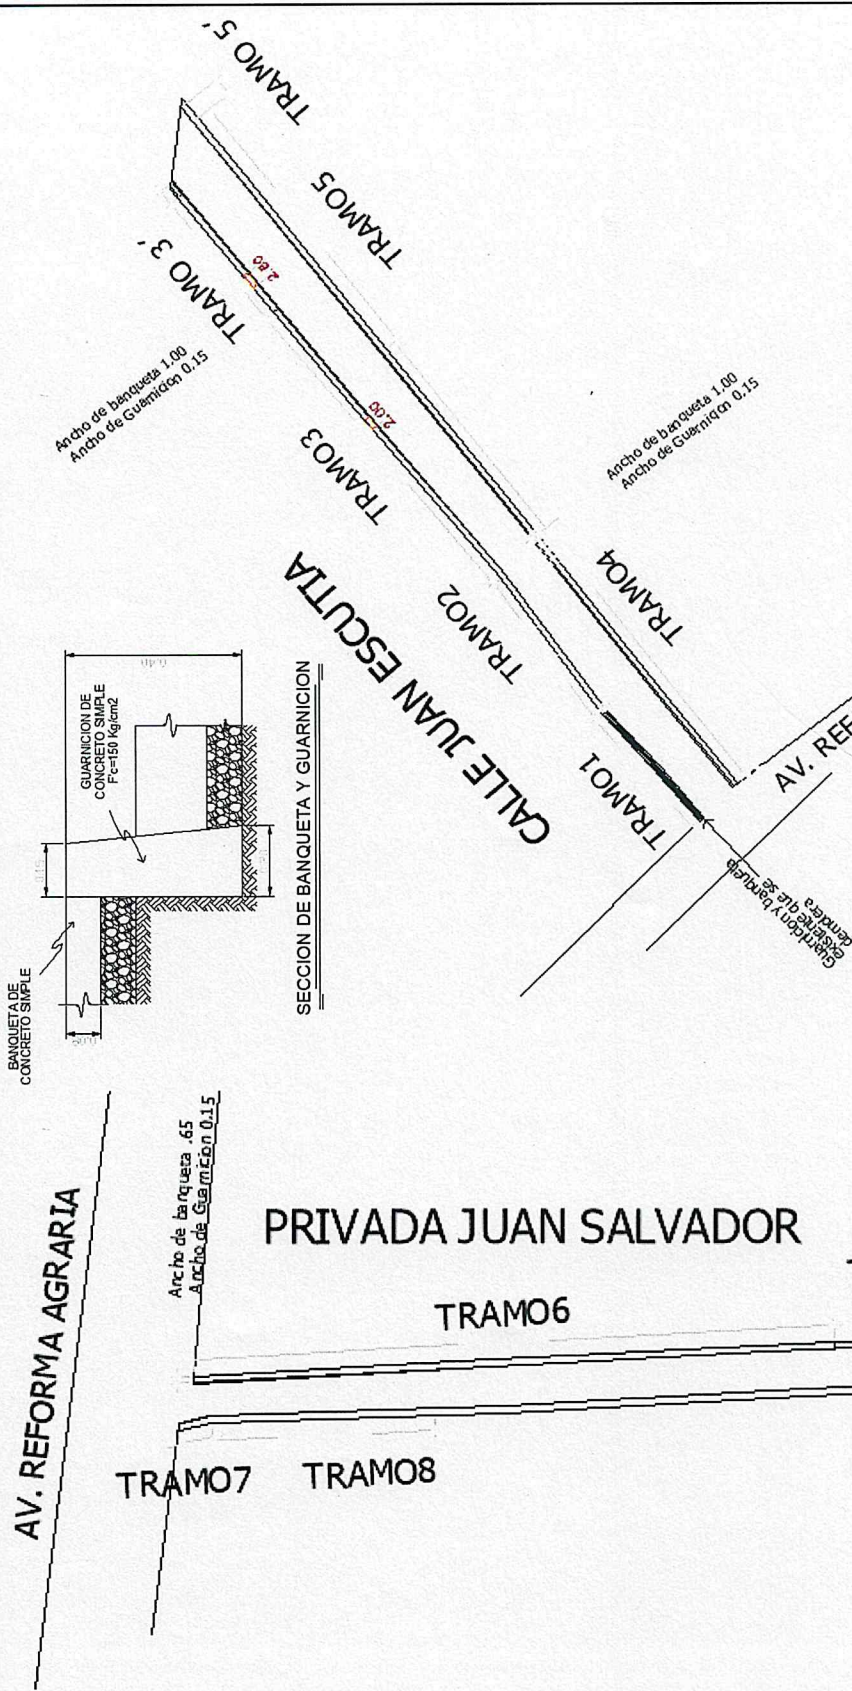

ING. GUSTAVO ANSELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES
 SUPERVISOR DE OBRA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

2020

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	ESTIMACION	
	CONTRATO	
CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	HERROS CONSTRUCTORA
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024	
MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024	


REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---



2020-2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-002	ESTIMACIÓN	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024	


REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTEJEMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-002 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION	


REPORTE FOTOGRAFICO

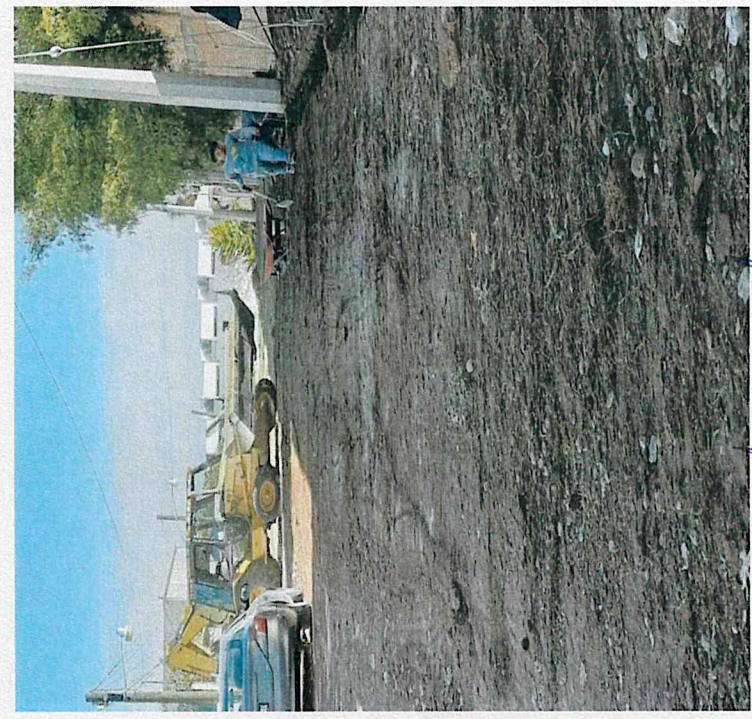

ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELOS DEL ANGELLO LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		
	CONTRATO NÚM.:	ESTIMACION	
	FECHA DE CONTRATO:	PERIODO DE EJECUCION	
	MONTO CONTRATADO: \$	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024	
PMZ-FAISM-089/2023-002 04 DE DICIEMBRE DE 2023 450,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACION: 05 DE ENERO DE 2024		


REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO
--	--	---



2020 - 2024


MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		INICIO DE OBRA:		
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-089/2023-002	06 DE DICIEMBRE DE 2023		
	FECHA DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE ENERO DE 2024		
	MONTO CONTRATADO:	\$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024		

REPORTE FOTOGRAFICO

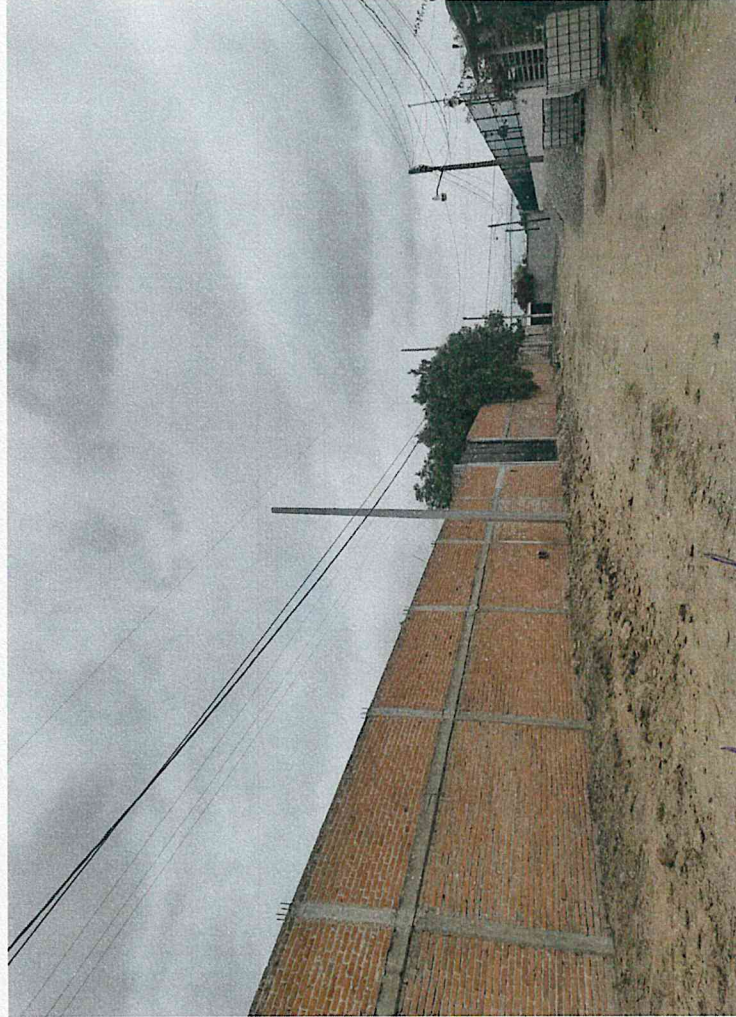

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO

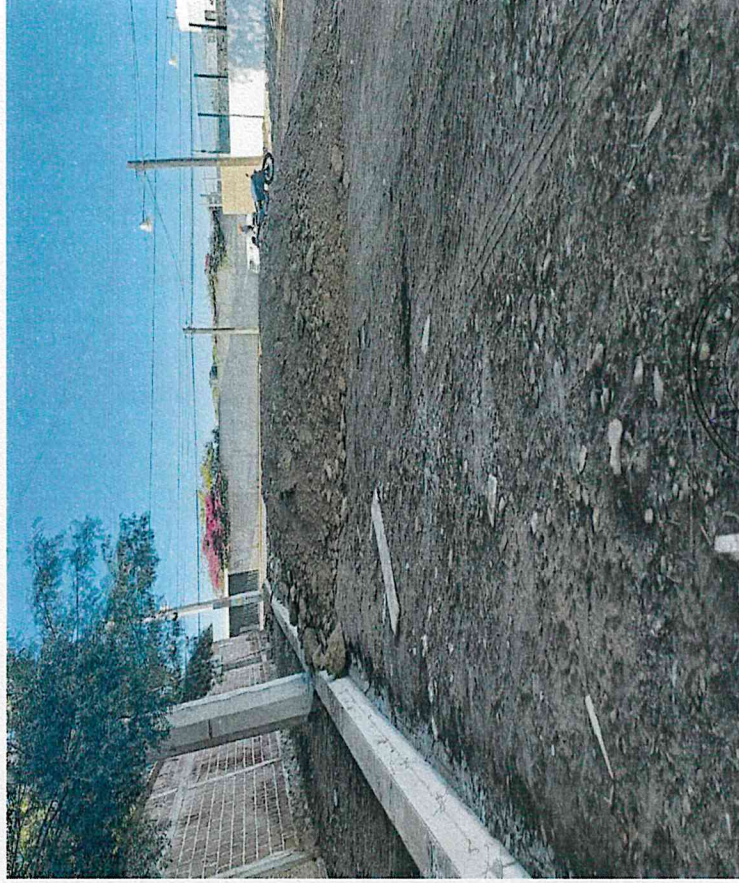

ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:
	FECHA DE CONTRATO:	TERMINACION:
	MONTO CONTRATADO:	PERIODO DE EJECUCION



REPORTE FOTOGRAFICO





ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YABELZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	--	---



2020 - 2024


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024
HERROS CONSTRUCTORA		

REPORTE FOTOGRAFICO

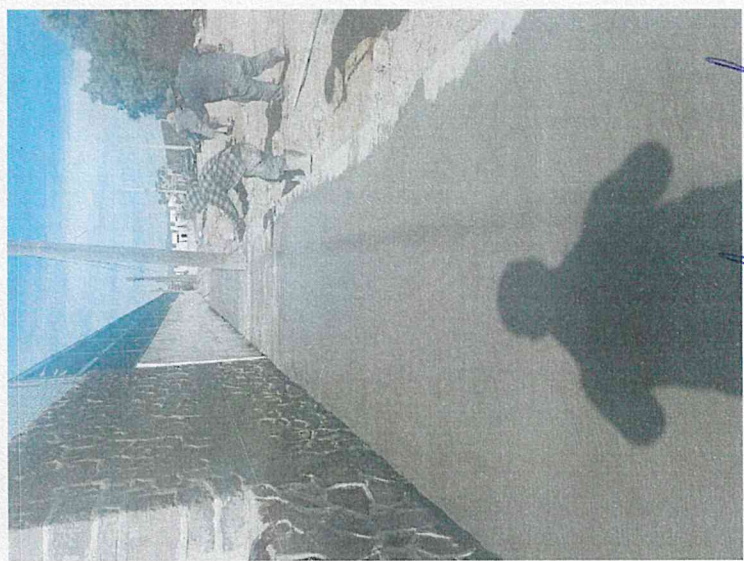
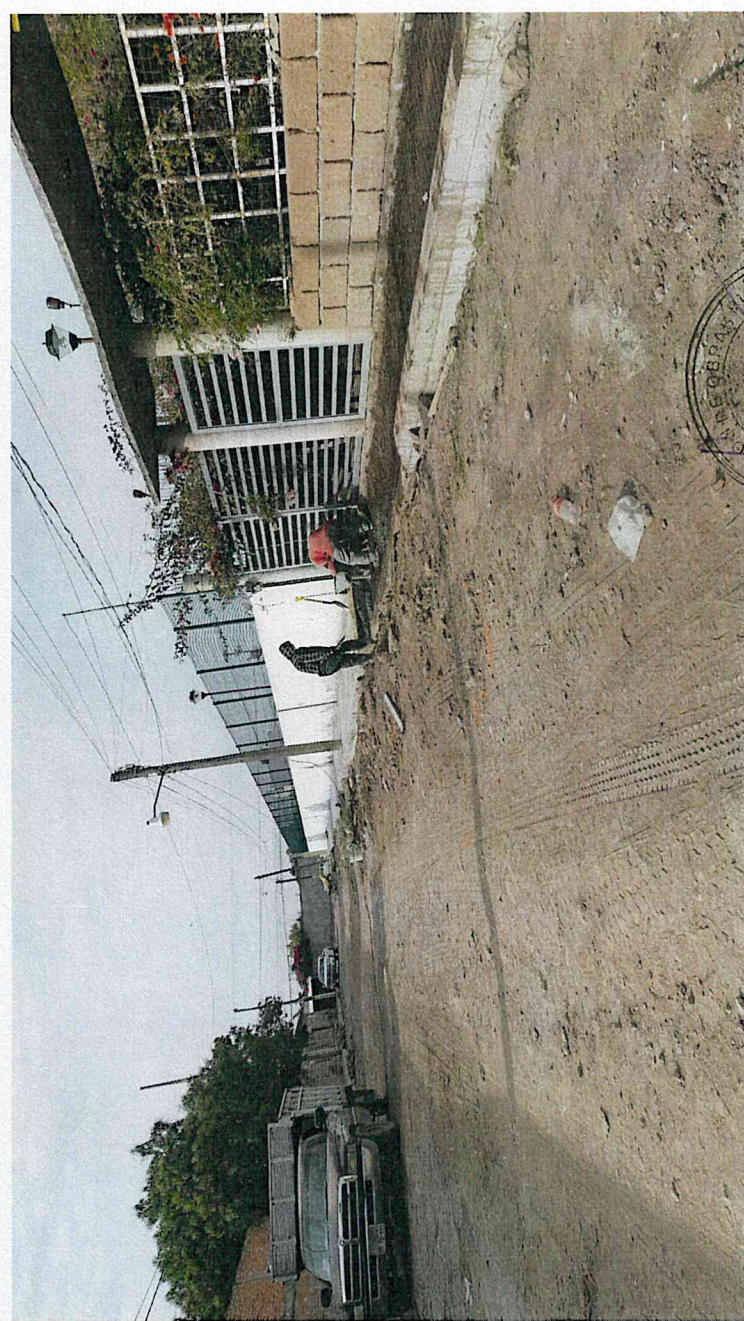


ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEIZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		ESTIMACION
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-089/2023-002	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO:	\$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024
			

REPORTE FOTOGRAFICO

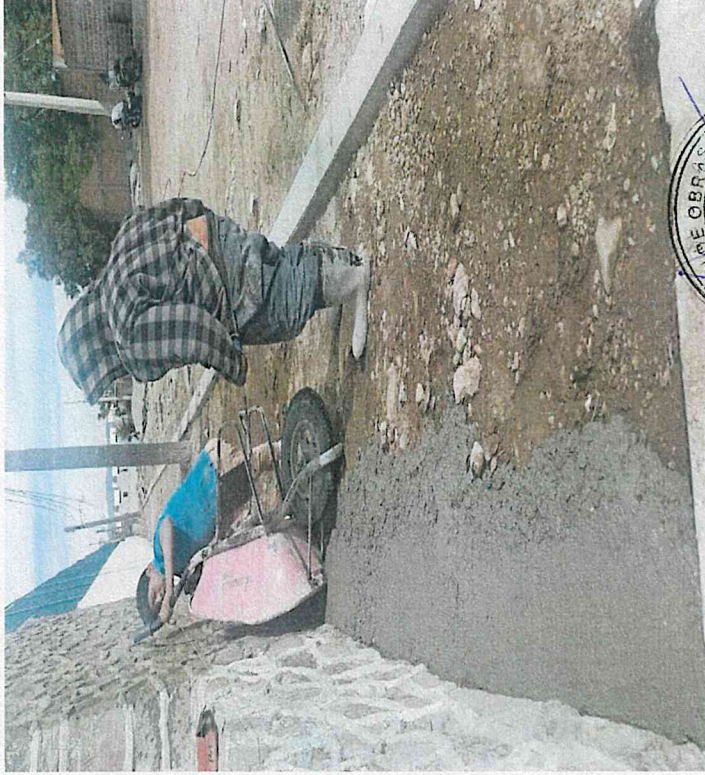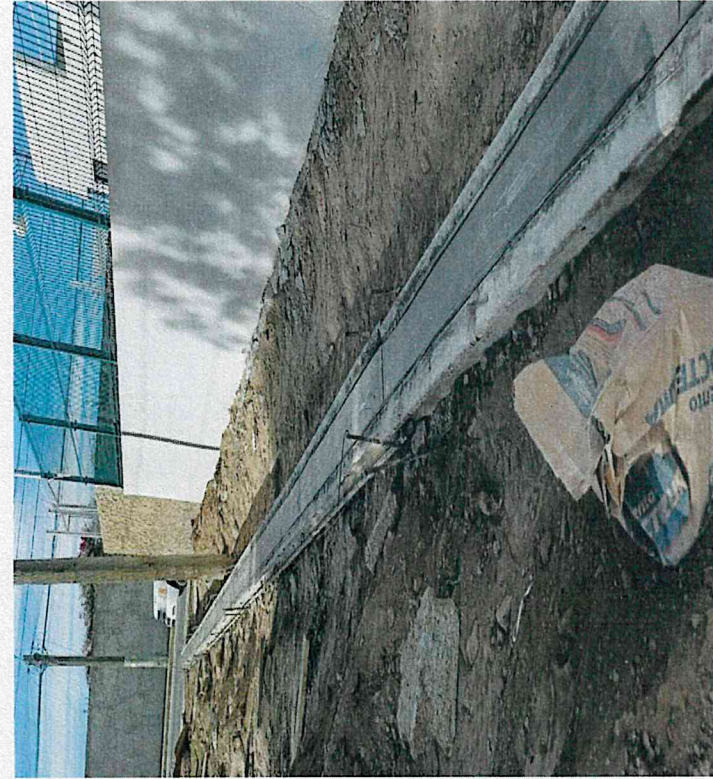

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTEJIMOS DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		ESTIMACION
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-002	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024	05 DE ENERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024	




REPORTE FOTOGRAFICO

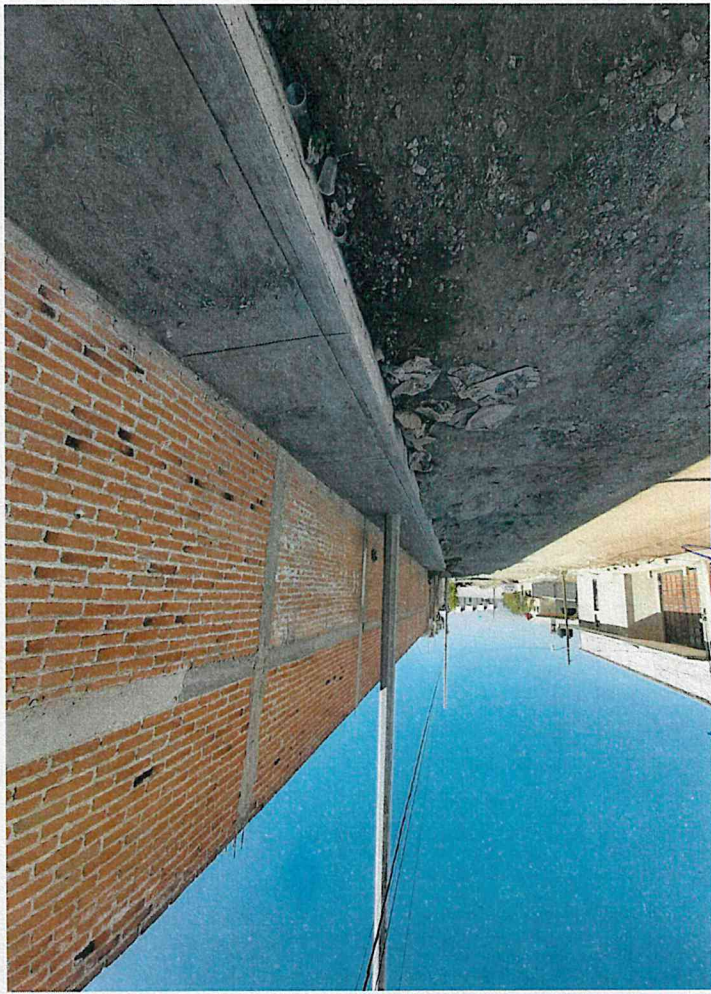


ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAE ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	---	--



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024
		EMPRESA
		


R E P O R T E F O T O G R A F I C O

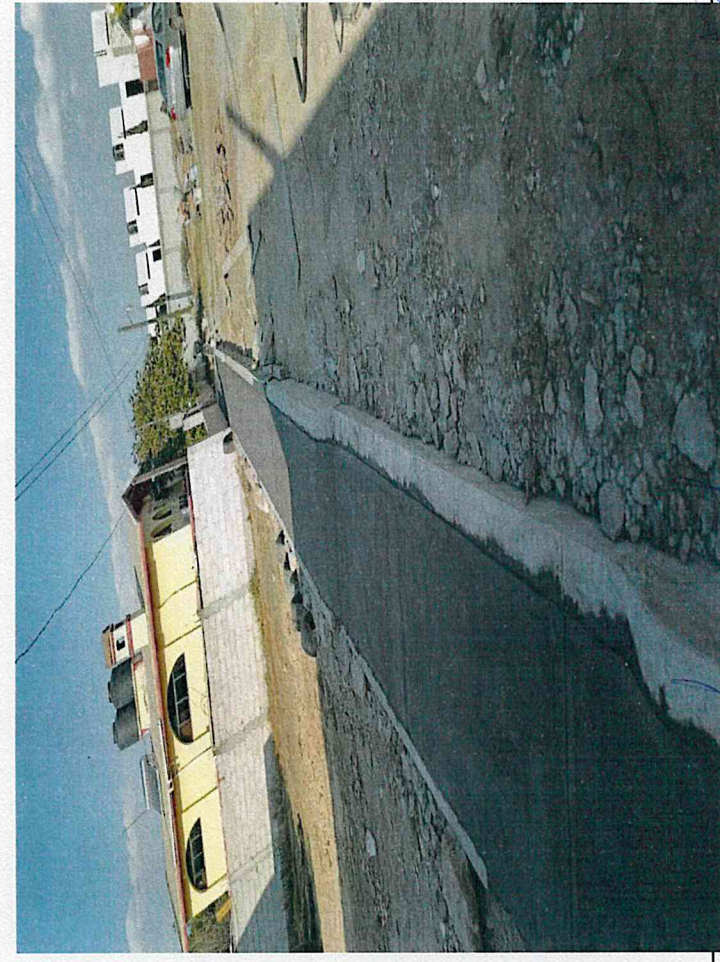


ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEIZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	---	---



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024
EMPRESA		
		

REPORTE FOTOGRAFICO

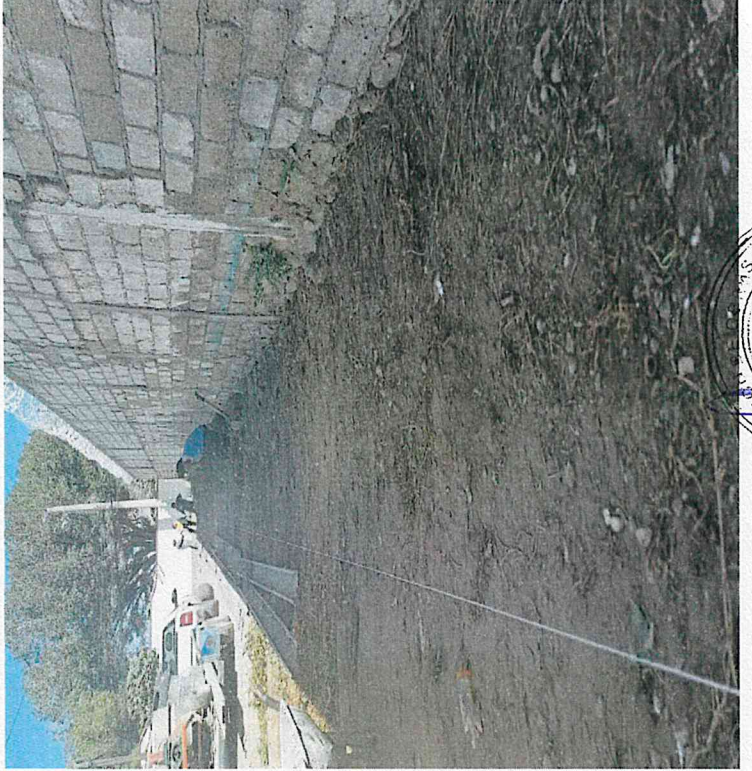

ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTONIOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	TERMINACION:	HERROS CONSTRUCTORA	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-002 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE ENERO DE 2024		
		PERIODO DE EJECUCION			
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024			

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANFERIDOS DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEIMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		INICIO DE OBRA:	
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2023-002	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE ENERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO:	\$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024	

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L' MENDOZA-DEL-TORO RESIDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL-ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---

2020 - 2024


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		INICIO DE OBRA:	HERROS CONSTRUCTORA
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-089/2023-002	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN:	05 DE ENERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO:	\$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024

REPORTE FOTOGRAFICO

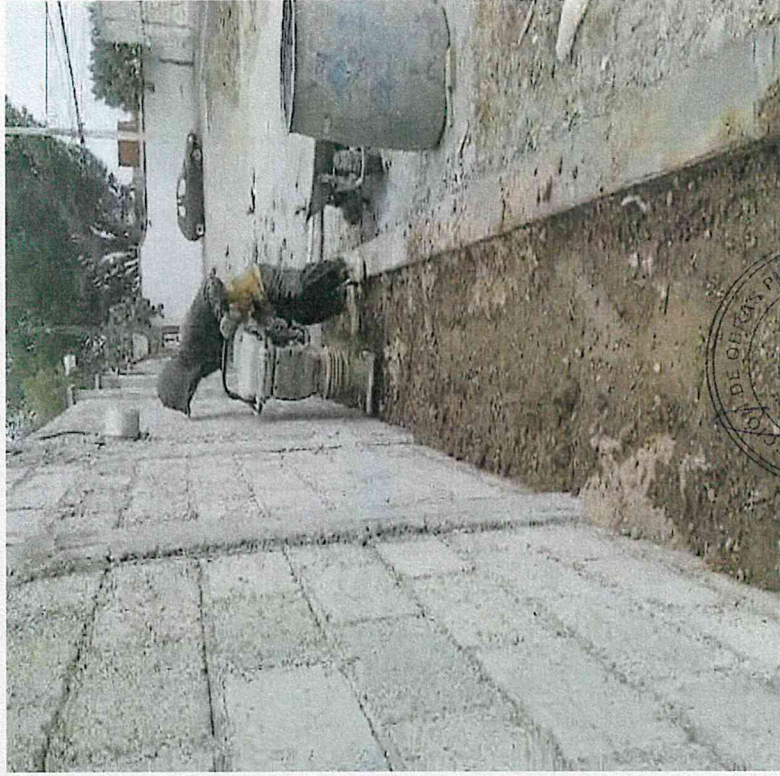


ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	--	---

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	TERMINACION:		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE ENERO DE 2024		
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	PERIODO DE EJECUCION			
	MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024			


REPORTE FOTOGRAFICO

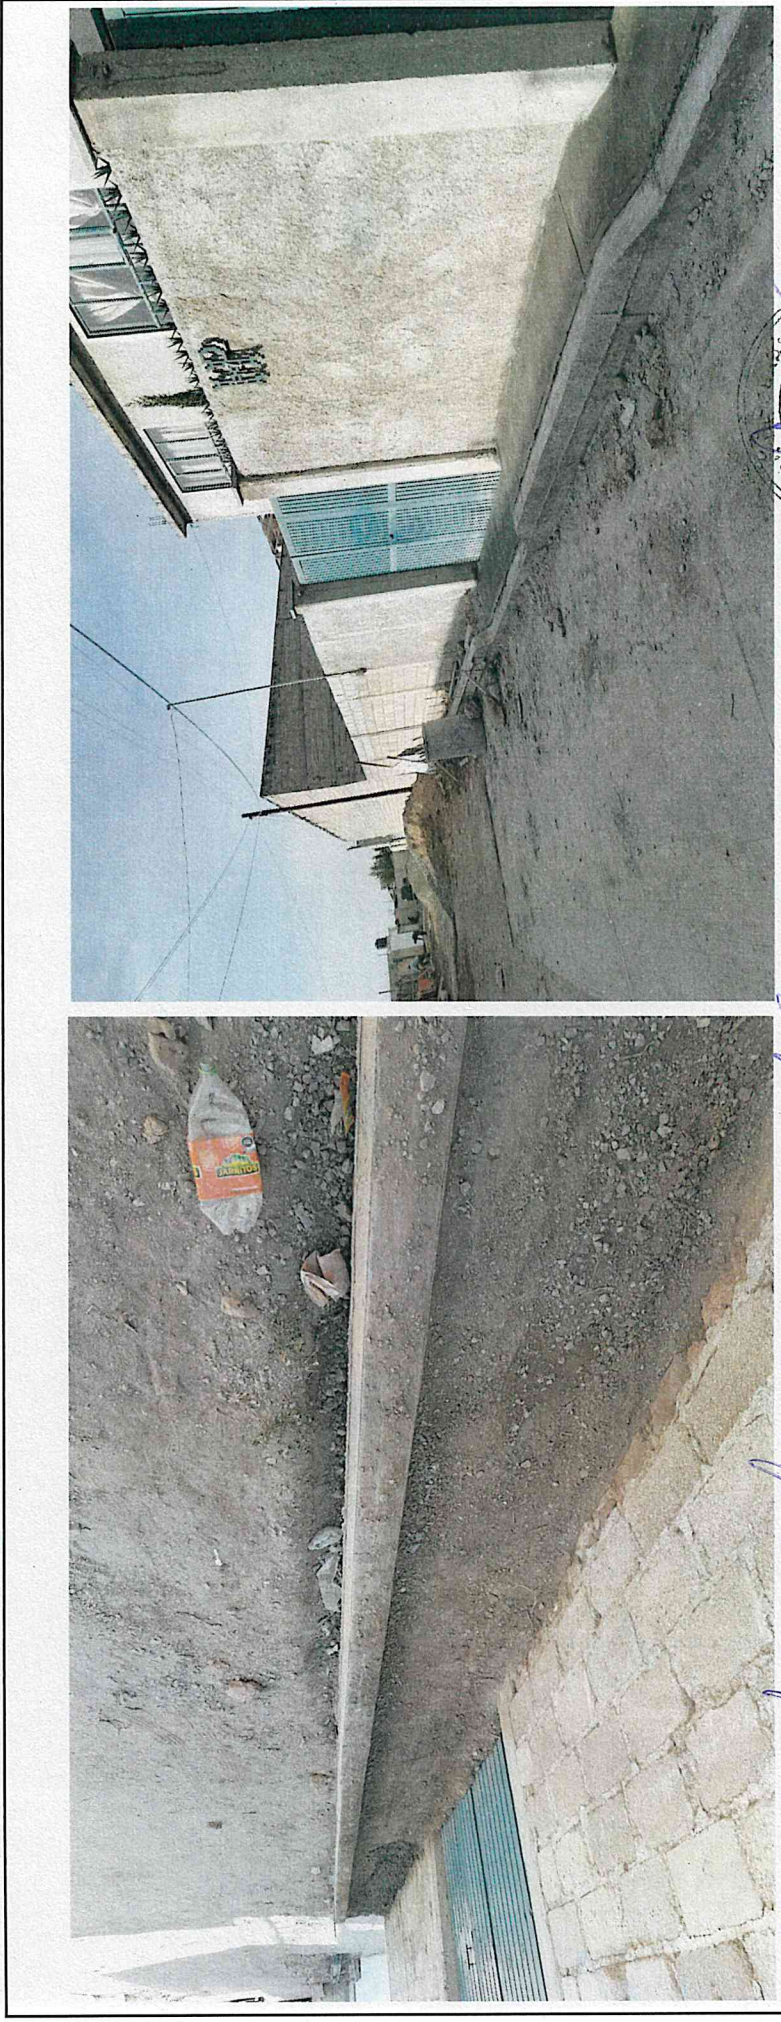


ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAELZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTEJIMOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO
---	---	--




2020 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	
NOMBRE DE LA OBRA:	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	
CONTRATO	ESTIMACION
CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024

REPORTE FOTOGRAFICO

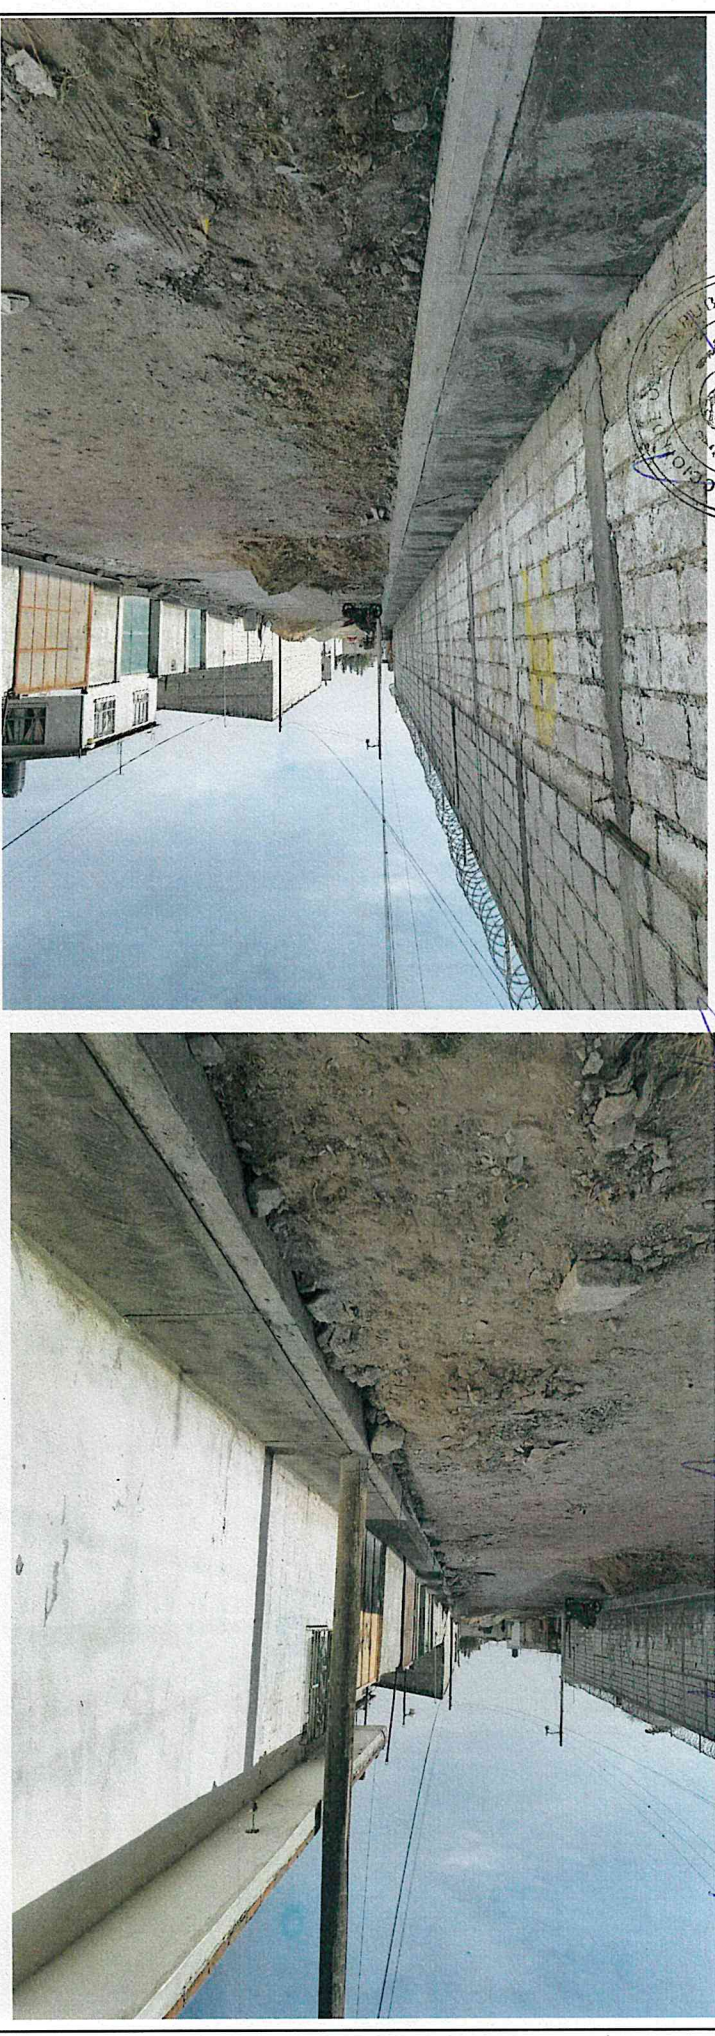

ING- ANTONIO L MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTONIOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
		
2020 2021		

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA	CONTRATO		ESTIMACION
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-002	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
	MONTO CONTRATADO: \$ 450,000.00		TERMINACIÓN: 05 DE ENERO DE 2024
			PERIODO DE EJECUCION
			06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAEZAMORA PAREDES
SUPERVISOR/DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024











PRESIDENCIA MUNICIPAL ZEMPOALA, HGO.
A QUIEN CORRESPONDA.

Por este medio solicito de la manera más atenta su apoyo para realizar la modificación de medidas al Proyecto de construcción de banqueta y guarnición de la Calle Juan Salvador, ubicada en Colonia Linda Vista, la petición específicamente es la reducción del ancho a 80 cm.

Dicha petición se requiere por así convenir a los intereses de los vecinos, debido a que la calle es más angosta a la medida estándar de una calle normal.

Sin más por el momento y estando de acuerdo la comunidad vecinal, agradecemos su atención al presente.

LISTA DE VECINOS

Nombre	Firma	No. Telefónico
Ana Lilia Meneses Orduño		771 341 8721
Moisés Uriel Chávez Ramírez		771 152 6537
Anna Daminda Chávez Meneses		711 121 6065
Leonardo U. Chávez Meneses		771 775 0245
Fernando Meneses Orduño		771 342 3375
José Domingo Vazquez		771 105 4155
Rocío M. Meneses Linares		771 799 3937
Patricia Meneses Linares		771 327 6916
Francisco Javier Meneses R.		771-315-1174
Isaí Yael Sánchez Meneses		771-410-78-77

NUMERO

FIRMA

NO TELEFONO

Joana Elzai Meneses Q.

Joana

771 271 77 81

Michael Hinojosa Cortezano

M. Hinojosa

771 124 32 96

Angel Meneses Orduño

Angel

771 213 61 53

Elizabeth Meneses Orduño ~~Elizabeth~~

771 122 37 42

Maria Angelica Meneses Baltazar *Maria*

771 382 76 46

SILVERIO HERNANDEZ PEREZ.

Silverio

771 201 92 95
